DOSSIER PASSAGE FIBRE OPTIQUE BHNS FRAIS VALLON – ST BARNABE

Echangeur Frais Vallon sens intérieur :

Dans la bretelle il y a des chambres entre les équipements L2 (Signalisation) et la SLT de la ville, vous devez arriver à pénétrer dans une chambre L2 sans trop de problèmes.

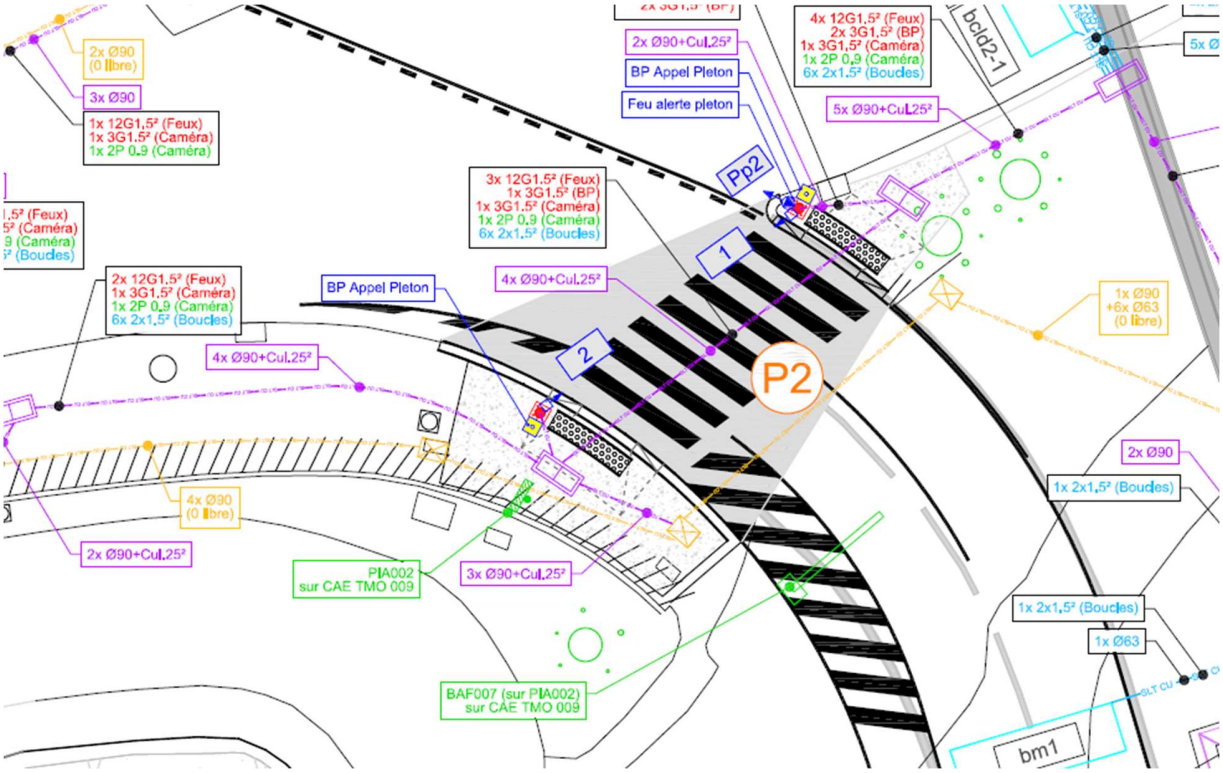

Bretelle entrée Frais Vallon :

On retrouve la chambre C29 au niveau de l'échangeur et ensuite on remonte vers la TC de Montolivet en passant par C26, C13 et C14, C07, C06, C05, C03 et C01 en extérieur.

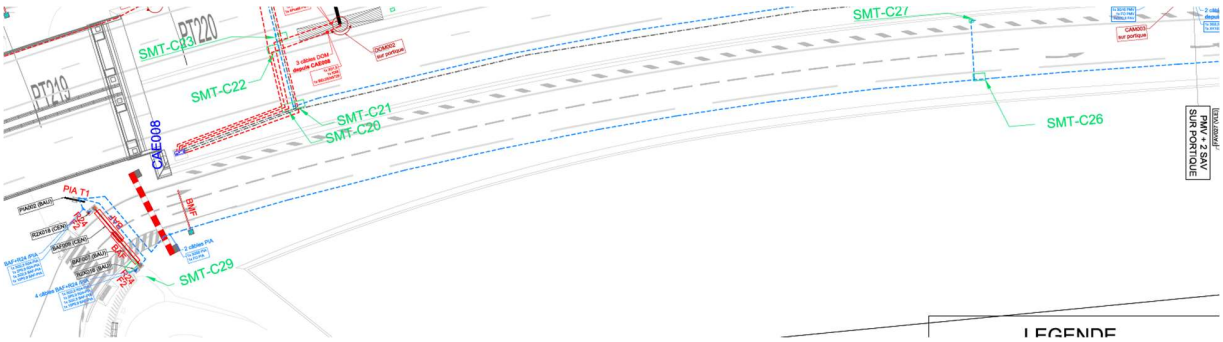

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2024

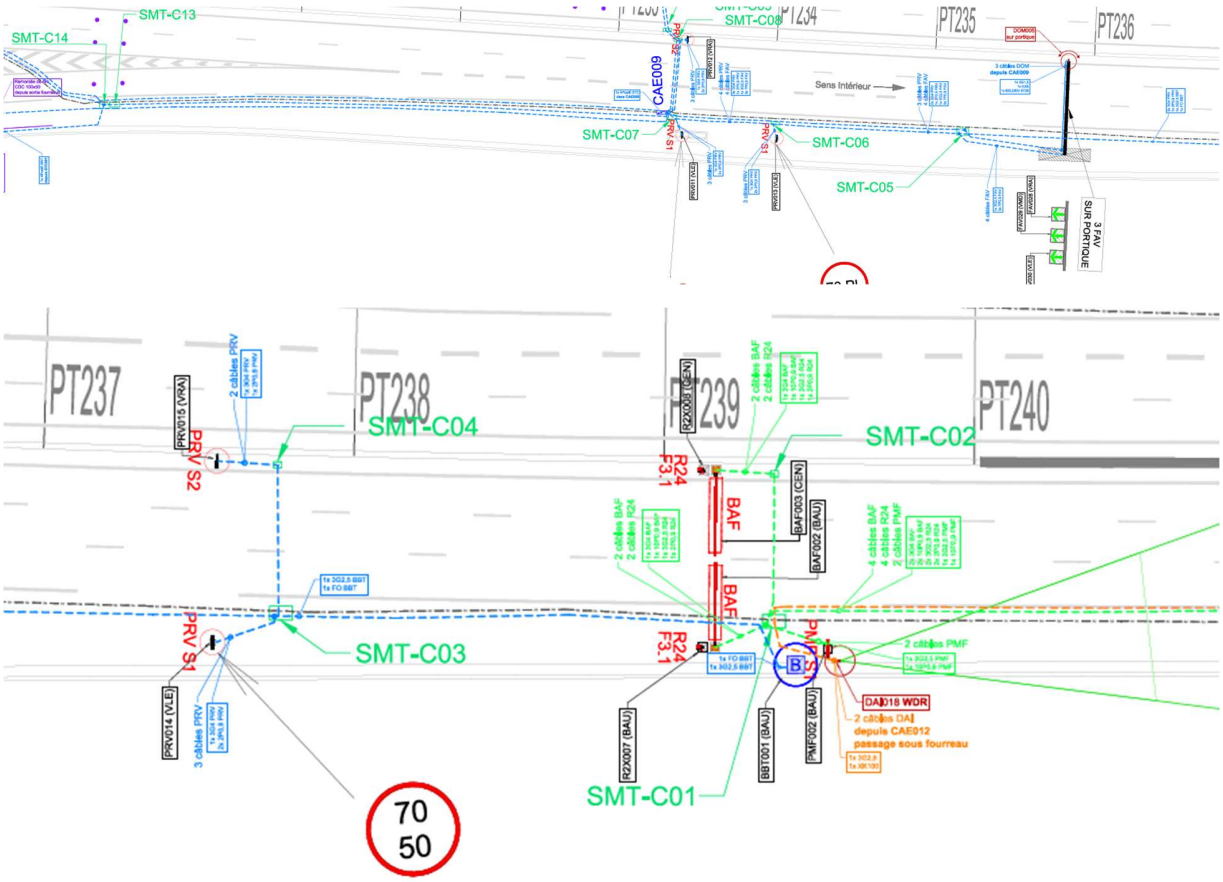

TC de Montolivet :

Dans la TC de il suffit d'ouvrir les chambres sur trottoir pour traverser environ 1km de tunnel.
Voir document **30218** aux pages 1 à 3 inclus.

Sortie TC Montolivet :

A la sortie du tunnel Montolivet il y a 2 chambres qui se trouvent sur la chaussée au niveau du zébra de la bretelle de sortie St Barnabé (C06 et C07)

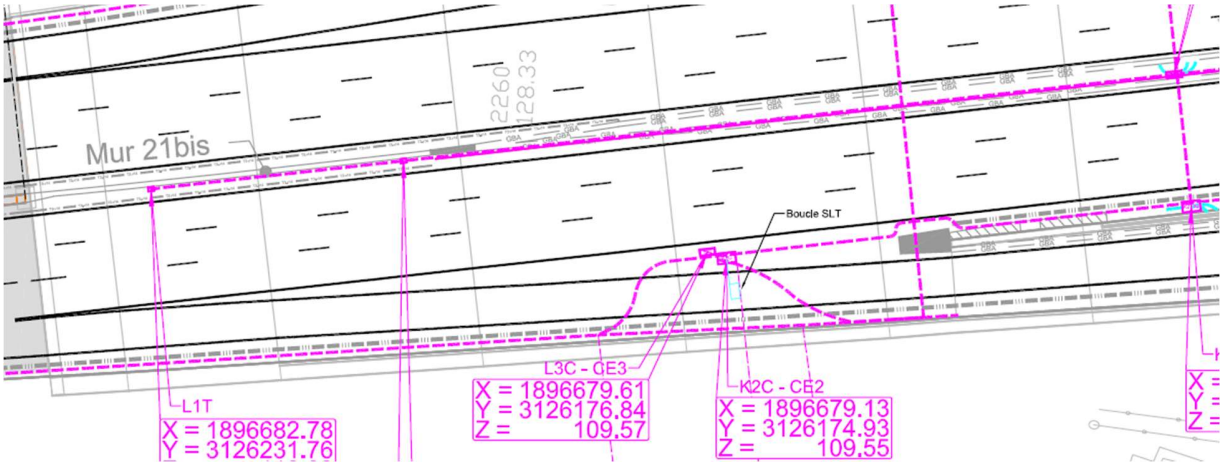

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2024

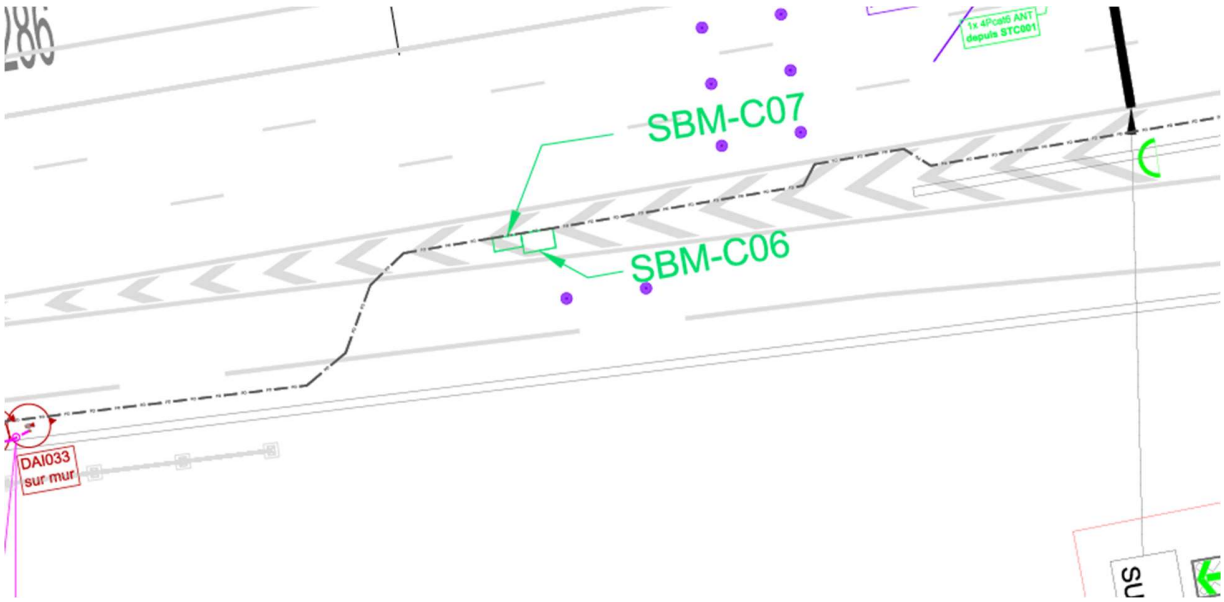

Bretelle de sortie St Barnabé :

Des canalisations remontent toute la bretelle de sortie pour la gestion de la SLT (Boucles et feux) donc vous devriez récupérer un cheminement assez simple pour sortir de la Rocade L2.
Voir document **91728** repères D, C et B pour le cheminement de sortie de la bretelle.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2024
